



141
Statens vegvesen
Nordland vegkontor

Telefax

Blanketten skal sendes foran dokumentet

T i l	Navn	Telefaxnr.
	Atle Stiberg	769 60800
	Adresse	
	Narvik veg- og trafikkstasjon	

F r a	Navn	Telefaxnr.
	Arne Sivertsen	75552951
	Avdeling/Kontor	
	Vegkontoret	Telefon
		755 52911
	Adresse	
	Bodø	

Dato/tid	Antall sider inkl. forside
3.09	2
Original blir oversendt	☐ Ja ☐ Nei


Merknader

Atle

Sender kopi av 2 bilder, som jeg håper du kan se noe av . Blir hele dagen på kontoret.

Hilsen fra

Arne

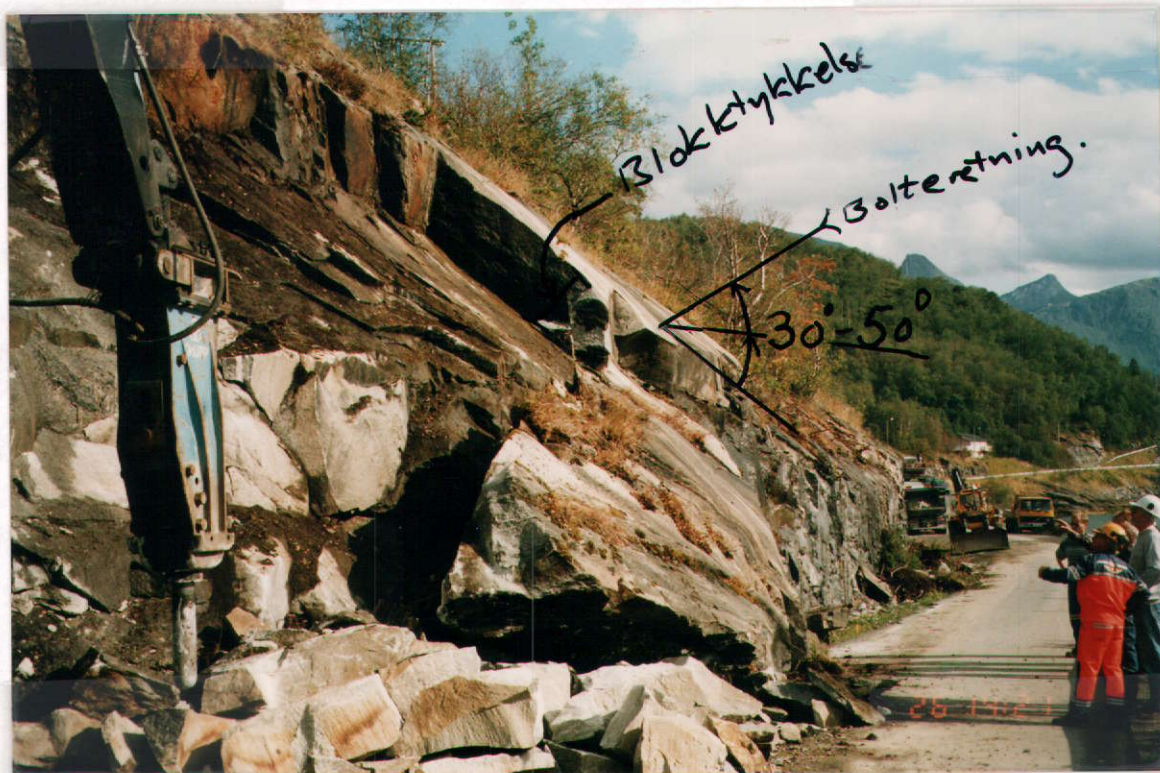

Bolten settes med en vinkel på mellom 30° og 50° på den sprekkeflaten, som blokken kan eller vil komme til å gli på.

Bolten må gå ca. 1 m inn i underliggende fjell. Total boltelengde er ca. $1,4 \times \text{blokktykkelse} + 1 \text{ m}$. Dvs. hvis blokktykkelsen er ca 1 m vil boltelengden bli ca 2,4 m.



Avstanden mellom sprekkenes er omkring 1 m i den venstre delen bilde og noe mer i den høyre delen. Sett en rast med bolter i blokkene som antydte og fortsett med ca. 1 m mellomrom ett stykke utenfor bildet.
